

Planning de migration — macro & micro

Migration Splunk → Google Chronicle & Dynatrace

Architecture cible, planning macro et micro, registre des risques.
Décommissionnement de Splunk visé sous 2 mois.

Document : Planning de migration (support du classeur Excel détaillé)

Date : 15 septembre 2026

Version : 1.0

Fichier compagnon : planning-migration-chronicle-dynatrace.xlsx

1. Résumé exécutif

2 mois

Délai cible avant arrêt complet de Splunk

13/11/2026

Date visée de décommissionnement

18/09/2026

Checkpoint résultat Dynatrace (David)

3

Chantiers menés en parallèle


Splunk sera remplacé par deux plateformes cibles : **Google Chronicle** pour les logs de sécurité (SIEM), et **Dynatrace** pour les dashboards et l'observabilité applicative/infrastructure. Trois chantiers techniques sont menés en parallèle :

- **AWS / CloudWatch** : collecte Linux & Windows via l'agent CloudWatch, ingestion dans Chronicle via son **Native Feed** (type « Amazon CloudWatch », rôle IAM assumé par Chronicle — AssumeRole, en mode pull HTTPS) ;
- **AIX / rsyslog** : les serveurs AIX transmettent en syslog (port 514) vers un **Chronicle Forwarder** (VM Linux dédiée), qui relaie ensuite en HTTPS vers l'API d'ingestion Chronicle ;
- **Dynatrace** : migration des dashboards Splunk (pilotee par David) et déploiement de **OneAgent** pour les logs applicatifs/infra ne relevant pas du périmètre sécurité.

Point critique déjà traité : une première tentative d'installation du binaire Chronicle Forwarder directement sur les serveurs AIX a échoué — la version d'AIX en place ne supporte pas ce binaire (incompatibilité de plateforme, le Forwarder n'existant qu'en version Linux). Décision prise : n'installer **aucun agent sur AIX**, et s'appuyer uniquement sur le relais syslog natif vers une VM Forwarder dédiée. Cette architecture est celle décrite dans ce document.

Point de décision à venir : le résultat de la migration des dashboards Dynatrace (David) est attendu le **vendredi 18 septembre 2026**. Il conditionne la décision Go/No-Go sur la généralisation du déploiement OneAgent (voir planning micro, tâche 6.1).

2. Architecture cible

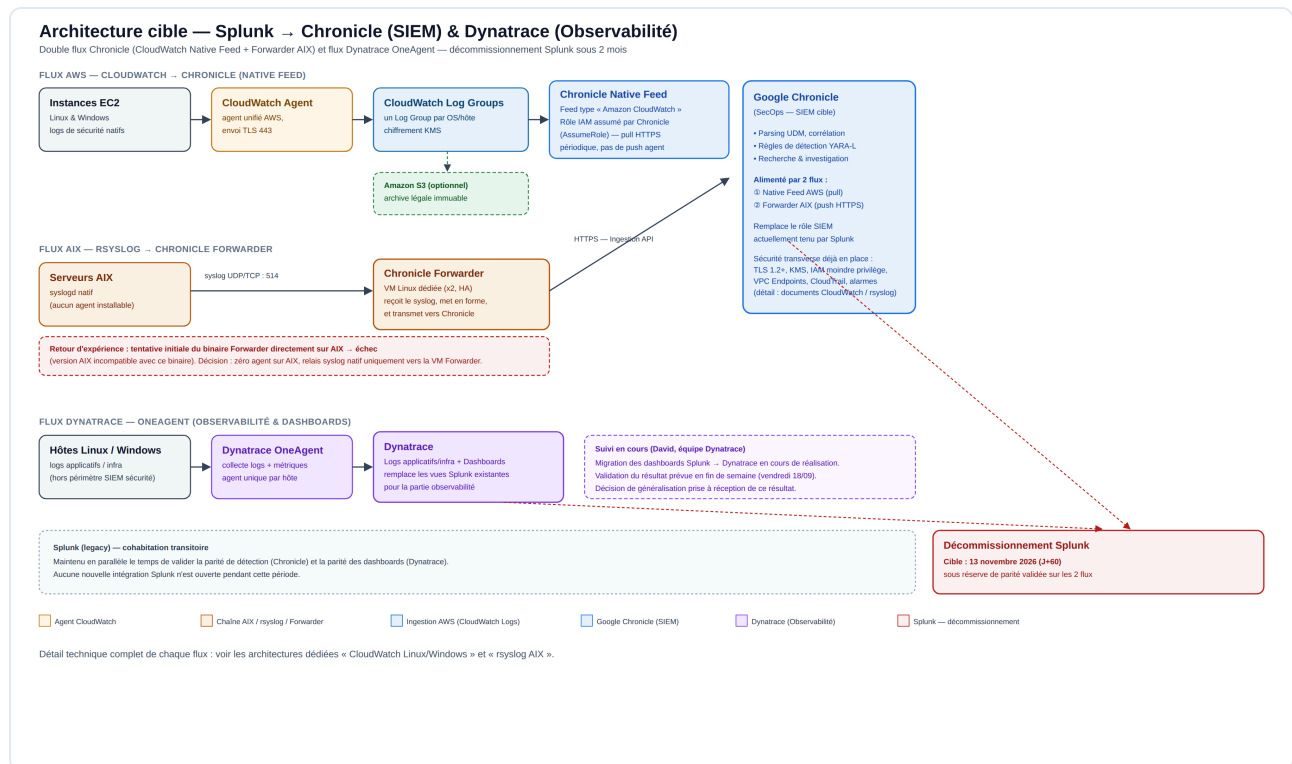

Détail technique complet de chaque flux : voir les architectures dédiées « CloudWatch Linux/Windows » et « rsyslog AIX » précédemment fournies.

2.1 Flux AWS — CloudWatch → Chronicle Native Feed

Le CloudWatch Agent collecte les logs de sécurité sur les instances EC2 Linux et Windows et les envoie vers des CloudWatch Log Groups dédiés. Chronicle interroge ensuite directement ces Log Groups via un **feed natif** : un rôle IAM est créé côté AWS avec une politique de confiance autorisant le compte de service Chronicle à l'assumer (**AssumeRole**), et Chronicle vient périodiquement **tirer** (pull) les nouveaux événements en HTTPS — aucune fonction de transformation (Lambda) n'est nécessaire, la normalisation UDM étant prise en charge nativement par Chronicle. Un export optionnel vers Amazon S3 reste recommandé pour l'archivage légal immuable, indépendamment du SIEM.


2.2 Flux AIX — rsyslog → Chronicle Forwarder

Les serveurs AIX transmettent leurs événements de sécurité via syslogd natif (port 514) vers un **Chronicle Forwarder**, une VM Linux dédiée (déployée en haute disponibilité). Le Forwarder reçoit le flux syslog, le met en forme, puis le transmet en HTTPS vers l'API d'ingestion Chronicle. Aucun composant Chronicle n'est installé sur AIX lui-même.

2.3 Flux Dynatrace — OneAgent

En parallèle du volet sécurité, les logs applicatifs et d'infrastructure qui ne relèvent pas du périmètre SIEM sont pris en charge par **Dynatrace OneAgent**, déployé sur les hôtes Linux et Windows. Les dashboards existants sous Splunk sont recréés dans Dynatrace par David ; le résultat de ce travail conditionne le calendrier de généralisation.

3. Planning macro

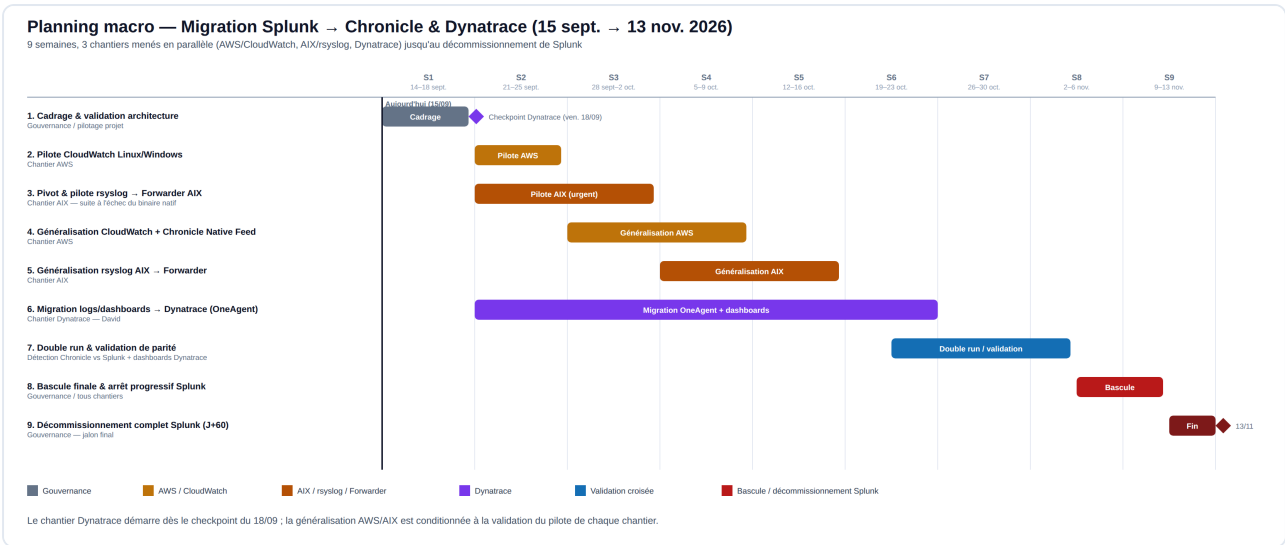

#	Chantier	Phase	Début	Fin	Statut
1	Gouvernance	Cadrage & validation architecture	15/09	18/09	En cours
2	AWS	Pilote CloudWatch Linux/Windows	21/09	25/09	À faire
3	AIX	Pivot & pilote rsyslog → Forwarder AIX	21/09	02/10	Urgent
4	AWS	Généralisation CloudWatch + Chronicle Native Feed	28/09	09/10	À faire
5	AIX	Généralisation rsyslog AIX → Forwarder	05/10	16/10	À faire
6	Dynatrace	Migration logs/dashboards → Dynatrace (OneAgent)	21/09	23/10	Attente checkpoint 18/09
7	Validation	Double run & validation de parité	19/10	30/10	À faire
8	Gouvernance	Bascule finale & arrêt progressif Splunk	02/11	06/11	À faire
9	Gouvernance	Décommissionnement complet Splunk (J+60)	09/11	13/11	Jalon final

Détail jour par jour et dépendances : voir le classeur Excel, feuille « Planning Macro ».

4. Planning micro — tâches clés par chantier

Le détail complet (35 tâches, dépendances, owners) figure dans le classeur Excel, feuille « Planning Micro ». Extraits ci-dessous par chantier :

4.1 AWS / CloudWatch

ID	Tâche	Owner	Période
1.2	Création du rôle IAM + politique de confiance pour Chronicle Native Feed (AssumeRole)	Équipe Cloud/AWS	16–17/09
2.1	Déploiement CloudWatch Agent sur périmètre pilote	Équipe Cloud/AWS	21–23/09
2.2	Configuration du Chronicle Native Feed	Équipe Sécurité/SIEM	22–23/09
4.1	Déploiement CloudWatch Agent à l'échelle (SSM/GPO/SCCM)	Équipe Cloud/AWS	28/09–07/10

4.2 AIX / rsyslog / Forwarder

ID	Tâche	Owner	Période
3.0	Analyse post-mortem : échec du binaire Forwarder sur AIX	Équipe AIX/Unix	15–16/09 (fait)
3.1	Déploiement de 2 VM « Chronicle Forwarder » (HA)	Équipe Cloud/AWS	21–23/09
3.5	Validation de la préservation de l'horodatage d'origine AIX	Équipe AIX/Unix	01–02/10
5.1	Bascule progressive de l'ensemble du parc AIX vers le Forwarder	Équipe AIX/Unix	05–13/10

4.3 Dynatrace

ID	Tâche	Owner	Période
6.0	Réception et revue du résultat de migration des dashboards	David (Dynatrace)	18/09
6.1	Décision Go/No-Go sur la généralisation du périmètre Dynatrace	Chef de projet migration	18–19/09
6.3	Recréation des dashboards Splunk restants dans Dynatrace	David (Dynatrace)	21/09–09/10
6.5	Déploiement OneAgent à l'échelle du parc restant	Équipe Cloud/AWS	12–23/10

4.4 Validation & bascule

ID	Tâche	Owner	Période
7.2	Exécuter le double run (Chronicle + Splunk en parallèle)	Équipe Sécurité/SIEM	19–27/10
7.5	Décision Go/No-Go décommissionnement Splunk	Comité de pilotage	30/10
8.2	Arrêt des forwarders Splunk (Linux/Windows/AIX)	Équipe Cloud/AWS + AIX/Unix	03–05/11
9.2	Décommissionnement des licences et de l'infrastructure Splunk	Chef de projet migration	12–13/11

5. Risques & points d'attention

ID	Risque	Chantier	Impact	Statut	Mitigation / Décision
R1	Incompatibilité du binaire Forwarder avec la version AIX en place	AIX	Élevé	Réalisé — traité	Aucun agent sur AIX ; relais syslog natif uniquement
R2	Dépendance à la validation des dashboards Dynatrace	Dynatrace	Moyen	En cours	Go/No-Go formalisé au 18-19/09
R3	Fraîcheur des données via le Native Feed (pull périodique)	AWS	Moyen	À surveiller	Dimensionner la fréquence de pull, surveiller le lag
R4	Point de défaillance unique sur le relais/Forwarder AIX	AIX	Élevé	Mitigé	HA (2 VM), file d'attente disque, tests de bascule
R5	Délai de 2 mois serré vu le nombre de chantiers parallèles	Gouvernance	Élevé	À surveiller	Suivi hebdomadaire en comité de pilotage
R6	Perte de couverture de détection pendant la bascule	Sécurité	Élevé	À traiter	Double run obligatoire avant arrêt Splunk
R7	Non-répudiation des horodatages AIX (relais vs source)	AIX	Moyen	À valider	Test explicite en recette (tâche 3.5)

Détail complet : classeur Excel, feuille « Risques ».

6. Prochaines étapes immédiates

1. Finaliser le cadrage et la validation de l'architecture d'ici le 18 septembre.
2. Recevoir et évaluer le résultat de migration des dashboards Dynatrace (David) le 18 septembre, puis acter la décision Go/No-Go de généralisation OneAgent.
3. Lancer en parallèle, dès le 21 septembre : le pilote CloudWatch (Linux/Windows) et le pilote Forwarder/rsyslog (AIX) — ce dernier en priorité, du fait de l'incident déjà rencontré.
4. Tenir un point hebdomadaire de suivi de planning (macro + micro) en comité de pilotage jusqu'au décommissionnement complet de Splunk.
